



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এম বি এম গার্মেন্টস লি:
ঠিকানা	M-19 & M-14, Section # 14
কারখানার কোড	DHK369
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ৩১-০৫-২০২২

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_1) Inadequate Factor of Safety (FOS)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factor of safety for this building has been found to be low with the existing gravity load. it is recommended to have a detail engineering assessment (DEA) of the structure as per section 17.2 of NTC guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 DEA report has been prepared and approved from DIFE on dated 18th september 2018 with buissness as usual certificate. On 05.11.2020: DEA has been approved from DIFE and they got buissness as usual certificate from DIFE. On 07.02.2021: DEA has been approved from DIFE and they got buissness as usual certificate from DIFE. 17.08.21 Visit observation: The factory got buissness as usual certificate from DIFE.


২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_1) As-built Drawings
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built Architectural and structural drawings of the different structural elements, foundation details to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 As built Architectural and structural drawings of the different structural elements, foundation details has been prepared for the building but on site during inspection we have found some mismatch with the existing condition. On 05.11.2020: Some mismatch found on their architectural drawing and they will update their drawing. On 07.02.2021: Some mismatch found on their architectural drawing and They were working on it. 17.08.21 Visit observation:Some mismatch found on their architectural drawing and They were working on it.

সংযুক্তিসমূহ (১)

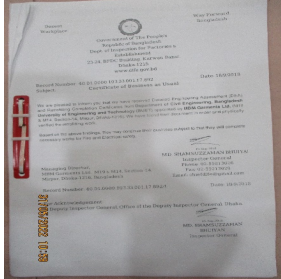

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_1) Floor Load Plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 Vetted load plan has been prepaed and duly posted on floors.Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor. On 05.11.2020: Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor. On 07.02.2021: Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor. 17.08.21 Visit observation: Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor.

8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_1) Load intensity
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 Overloading has been found on 3rd floor Cad room due to fabric roll. On 05.11.2020: No overload found on inspection day. Load has been reduced from previous inspection on 3rd floor Cad room area. On 07.02.2021: No overload found on inspection day. 17.08.21 Visit observation:No overload found on inspection day.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্টি	Horizontal and Vertical Extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 A rooftop shed (Bamboo Structure) has been found; which is used as prayer room. On 05.11.2020: This light weight (Bamboo Structure) has been found during inspection day which is used as prayer area. On 07.02.2021: This light weight (Bamboo Structure) has been found during inspection day which is used as prayer area. 17.08.21 Visit observation: This light weight (Bamboo Structure) has been found during inspection day which is used as prayer area.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৬. পর্ববেষ্টি

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_1) Distress in Primary Structural Element
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 No distress has been found on primary structural members during inspection. On 05.11.2020: No distress has been found on primary structural members during inspection day. On 07.02.2021: No distress has been found on primary structural members during inspection day. 17.08.21 Visit observation:No distress has been found on primary structural members during inspection day.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_2) Inadequate Factor of Safety (FOS)
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factor of safety for this building has been found to be low with the existing gravity load. it is recommened to have a detail engineering assessment (DEA) of the structure as per section 17.2 of NTC guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-১০-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 DEA report has been prepared and approved from DIFE on dated 18th september 2018 with buissness as usual certificate. On 05.11.2020: DEA has been approved from DIFE and they got buissness as usual certificate from DIFE.


৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_2) As-built Drawings
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built Architectural and structural drawings of the different structural elements, foundation details to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৫-১০-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 As built Architectural and structural drawings of the different structural elements, foundation details has been prepared for the building but on site during inspection we have found some mismatch with the existing condition. On 05.11.2020: Some mismatch found on their architectural drawing and they will update their drawing.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_2) Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রশোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৯-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 Vetted load plan has been prepaed and duly posted on floors. On 05.11.2020: Vatted load plan has been approved from DIFE and we found floor load plan posted on every floor.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_2) Load intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রশোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 No overloading has been found on floors. On 05.11.2020: No overload found on inspection day.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_2) Horizontal and Vertical Extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৪-০২-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 No horizontal or vertical extension of the building has been found. On 05.11.2020: No horizontal or vertical extension of the building has been found during inspection day.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	(Building_2) Distress in Primary Structural Element
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 02-March-2020 No distress has been found on primary structural members during inspection. On 05.11.2020: No distress has been found on primary structural members during inspection day.
