



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	গার্লিশ মোবাইলস লিমিটেড
ঠিকানা	Digiborabo, Rupgang, Narayanganj
কারখানার কোড	NR098
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: **অগ্নি মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: **৩০-০৮-২০২২**

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to conduct fire drill quarterly (4 times a year) under the fire safety plan and needs to kept the written record of such drills for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are practicing fire drill regularly.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: The initiative of conducting fire drill quarterly under the fire safety plan and keeping the written record of such drills is in progress. 24.01.2021: Conductivity of the fire drill has not been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We test all the equipment and keep record properly.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Having proper testing plan & record of fire safety equipment is in progress. 24.01.2021: During the inspection of fire extinguisher testing and record has been found the date expired. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum and total width of marked aisles
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have marked aisles properly in all working floor.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18-10-20: Factory has marked aisles in all working floor. 24.01.2021: Aisles mark has not been properly maintained. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: In some floors aisles marks found compliant but not in all floors.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the slab.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will seal by rated construction properly.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১১-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Sealing all openings rated construction is in progress. 24.01.2021: Penetration and opening have been found in rated walls and slab at the storage area. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পৰ্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have install adequate exit sign where required.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18-10-20: Installation of adequate exit sign and directional sign is in progress. 24.01.2021: Visibility and uniformity of exit signs have not been found properly. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: Exit signs are not found at all exits. Some exit signs found during the visit.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As Built Drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will prepare as built drawing soon.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of adequate exit sign and directional sign has not started. 24.01.2021: As Built Drawing of machine layout & escape route has not been maintained. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Validity and full area coverage of fire license
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have valid fire license covering the full occupied area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have updated fire license.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18-10-20: According to them, they have taken the full coverage area of fire license but were unable to show while we visited their factory. 24.01.2021: The fire license has been covered in the full occupied area. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: Completed

সংযুক্তিসমূহ (১)



৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have obtain trainig from fire dept.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20:Obtaining training from the fire department is in progress. 24.01.2021: Fire safety training from BGMEA or Fire service has not been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit door
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have remove all lockable doors
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Replacing all exit doors by side swinging doors is in progress. 24.01.2021: Non rated fire doors (steel type locking device and side swing type) has been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have provided handrail on both side of stair
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18-10-20: Providing handrail on both sides of all the stairways is in progress. 24.01.2021: Handrail on both sides of Most of the stairways handrail on both sides has not been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: Bothside handrails are found during the visit.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have provided adequate number emergency light.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs (Escape route) is in progress. 24.01.2021: Tagged illuminated emergency light has not been found. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: Emergency lights are not found in the factory.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide critical fire safety system with required backup power soon.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১২-২০২১
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory did not have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline. 24.01.2021: Emergency backup power has not been found for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standby generator with required backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have standby generator with sufficient backup power.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We provided standby generator.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory has standby generator with sufficient backup power. 24.01.2021: standby generator has been found for backup power. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No dedicated backup generator found.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will obtain pre planing from fire dept soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory did not have fire department pre-plan. 24.01.2021: Fire department pre-plan has not been taken any initiative yet. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.


১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit route-1 (Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to be protected washing section at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from washing section at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will separate final exit route by proper fire rated wall and fire doors.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory did not have separate final exit route by proper fire rated wall and fire doors. 24.01.2021: Final exit routes have not been found Fire separated. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

সংযুক্তিসমূহ (১)

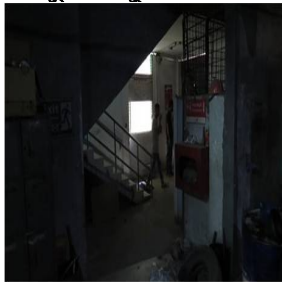

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide the protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will separate storage area by proper fire rated wall and fire doors.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory did not separated storage area by proper fire rated wall and fire doors. 24.01.2021: Staircases have not been protected from Fire and smoke. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: Stairs are not separated by fire rated construction and opening protections.

সংযুক্তিসমূহ (২)



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install centralized AFD and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory did not installed centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline. 24.01.2021: Automatic centralized fire detection system with fire alarm and call point has not been installed. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install centralized AFD and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system is in progress. 24.01.2021: Automatic centralized fire detection system with fire alarm and call point has not been installed. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install control panel for centralized Automatic fire detection and alarm system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline has not started. 24.01.2021: Control panel for automatic fire detection and alarm system. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install proper standpipe system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser is in progress. 24.01.2021: Standpipe system should have had at least 75mm dia but still the factory has been found less than 75 mm dia standpipe. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install 1 hose per 1000 m2 and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install Standpipe system with adequate number hose soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of Standpipe system with adequate number hose has not started. 24.01.2021: Adequate number of hose has not been installed yet. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install Standpipe system with dedicated fire pump soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Installation of Standpipe system with dedicated fire pump has not started. 24.01.2021: Without a dedicated fire pump the standpipe system has not been found maximum pressure. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install Standpipe system and siamese soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory did not installed Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection. 24.01.2021: Siamese connection has not been found for the fire department in the outside of the factory building. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install fire pump with required capacity.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory did not installed dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity to achieve required pressure in the remote place of the factory. 24.01.2021: Dedicated fire pump has not been found for fire fighting. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least $1900 \times 75 = 142500$ liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will establish another water storage tank with adequate capacity.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৫-২০১৫
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18-10-20: Factory did not installed sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment. 24.01.2021: Sufficient water capacity has not been found for RMG guideline and hose pipe not now in operational. Observation from visit date 24-08-2021 (CVV-05) : Same as before 30/08/2022: No action has been taken yet by the factory.
