



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য


কারখানার নাম	গার্লিশ সোয়েটারস লিমিটেড
ঠিকানা	Digiborabo, Ruggang, Narayanganj
কারখানার কোড	NRYO98
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ৩০-০৮-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	"Mismatch found between structural design drawing and as constructed structure. There are no cantilever in structural drawing but we found 300x280 cantilever in north side (grid no. C/4, C/5, C/6)."
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	"Structural engineer prepare as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure."
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	" On 18-10-2020-Factory authority submitted as built drawings to DIFE on 22-November-2018. As-built drawing has not been found at site during inspection. Also no as-built drawing for extension part has been found at site during inspection. 24-01-2021 , During inspection we did not found any types design drawing at factory . The factory authority submitted as build drawing to DIFE on 22-11-2018. On 24/08/2021-During inspection we did not found any types design drawing at factory . The factory authority submitted as build drawing to DIFE on 22-11-2018. 30/08/2022- Any types design & drawing has not found at factory during inspection .The factory authority submitted just a as build drawing to DIFE on 22-11-2018. But no drawing & design report has not submit to DIFE yet."

সংযুক্তিসমূহ (১)

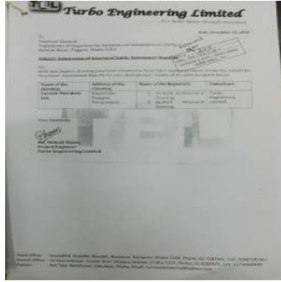

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Corrosion found at rebar due to exposed condition.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 18-10-2020- Protective coating for the exposed rebar has been observed during inspection. 24-01-2021 , The factory authority already provided protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. On-24/08/2021-The factory authority already provided protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. 30-08-2022: The factory authority already provided protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. "

সংযুক্তিসমূহ (২)

