



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|---|--|
| কারখানার নাম | এ্যামড্রোনীট ওয়ার লিঃ |
| ঠিকানা | American Plaza, Zorun, Konabari, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP044 |
| কালার কোড | |
| মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১২-০৪-২০২৩ |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ One point frame earthing of generator instead of two |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | □ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 07.10.2020: Generator has one point body earthing. 14.01.2021: Generator has one point body earthing. 11.04.2021: Generator has two point body earthing. 16.08.2022: Two point frame earthing of generator were observed. 12-04-2023 : Only two earthing pit found for two generator. |

সংযুক্তিসমূহ (৪)



২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | ☐ No cable trench with cover |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | ☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire door for the Generator room ☐ Install appropriate detectors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 07.10.2020: No cable trench was observed. 14.01.2021: Cable trench was observed. 11.04.2021: Cable trench was covered by wooden board. 16.08.2022: Cable trench were not found by covered. 12-04-2023: Same as previous. |

সংযুক্তিসমূহ (২)




৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | ☐ Cable ends not properly soldered or crimped |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | ☐ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box ☐ Ensure well-dressed cabling with lugs |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 07.10.2020: Cables Cable ends not properly soldered. 14.01.2021: Cables are connected with cable lux except some SP breakers. 14.04.2021: Cables are connected with cable lug. 16.08.2022: 1.Easy access to MDB/MCB Box were found properly. 2.Cable ends were found with proper size lugs. 12-04-2023 : Same as previous. |

সংযুক্তিসমূহ (৪)

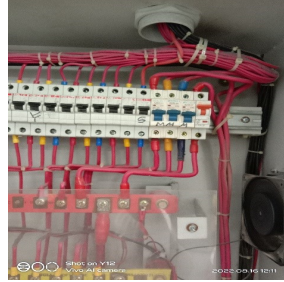


8. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ Connection without lug |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | □ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box □ Ensure well-dressed cabling with lugs |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 07.10.2020: Cables connected without proper cable lug in one circuit breaker. 14.01.2021: Cables are connected with cable lux except some SP breakers. 16.08.2022: Cables were found with proper size lugs. 12-04-2023: Same as previous. |

সংযুক্তিসমূহ (২)

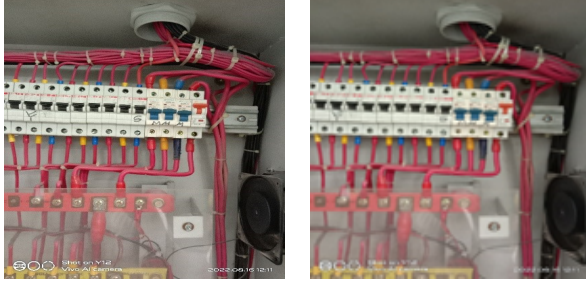


৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Undressed messy wire inside |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed cabling with lugs |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 07.10.2020 Undressed messy wire was not observed. 14.01.2021: Undressed messy wire was observed. 14.04.2021: Cables are connected with cable lug. 16.08.2022: Undressed messy wire were not observed. 12-04-2023 : Same as previous. |

সংযুক্তিসমূহ (২)

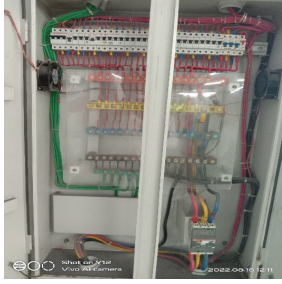

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | ☐ Lightning protection system not available |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | ☐ Provide appropriate Lightning protection system. ☐ Provide air termination network |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 07.10.2020: LPS was not installed. Lightning protection system is not installed on the building as per the design and drawing DIFE for final approval. 14.01.2021: LPS was not installed. 11.04.2021: LPS was not installed. 16.08.2022: LPS drawing has been approved by DIFE but factory not yet installed LPS system. 12-04-2023 : Same as previous. |

সংযুক্তিসমূহ (৪)

