



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কাপপা ক্যাশন ওয়ার লিমিটেড
ঠিকানা	West Isdair, Tagerpar, Fatullah, Narayanganj ( Opposite Of Police Line. )
কারখানার কোড	NRV128
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: <b>কাঠামোগত মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>২৫-০৪-২০২২</b>
--	---------------------------------------

<b>১. পর্যবেক্ষণ</b>	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Undocumented non engineering shed with periphery brick wall have been found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<b>১.১. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Building engineer to assess light weight roof structure and confirm its ability to withstand all wind loading pressure suctions and uplift forces.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already appointed DIFE enlisted consultant to assess lightweight roof structure in roof ,soon the work will start.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 29-12-2020: The factory management had removed the Undocumented non engineering shed with periphery brick wall. They also have achieved Structural Certificate from Accord



<b>২. পর্যবেক্ষণ</b>
----------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inconsistencies found between structural documents and as constructed arrangement of the factory. Beam column frame shown in drawing, but existing condition is flat plate system. Corner column (12"x15") mentioned in drawing, actually 12"x12" is found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare full set of as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already appointed DIFE enlisted consultant to prepare as built structural drawing, floor load plan and prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 29-12-2020: They have achieved Structural Certificate from Accord 25-04-2022 (CCVV) : Few mismatches observed on architectural layout on 1st floor & 4th floor.

## সংযুক্তিসমূহ (২)

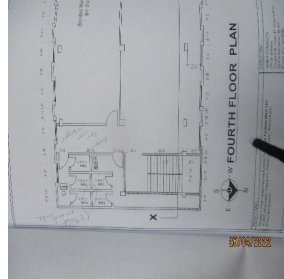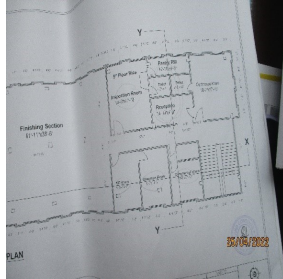

## ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will continue to implement load plan
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 29-12-2020: They have achieved Structural Certificate from Accord
