



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	জ্যাকেন্ট টেক্সটাইলস লিঃ
ঠিকানা	Baniarchala, Mahona, Mouza # 3, Vabanipur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP137
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কার্টামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৬-০২-২০২৩

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 1 Load bearing capacity of steel sections and connections are unknown as no structural design drawing is available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural Engineer to check the connections and capacities of all steel connections.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	04.03.2021: Designs and drawings were submitted to RSC for review. Since then no response from RSC. Designs were not available on site. 29-05-2022 (CCVV): Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get approved then their remediation will have no obstacles. 16-02-2023: Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get approved then their remediation will have no obstacles

সংযুক্তিসমূহ (২)




পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 1 Corrosions have been found in steel member causes damage due to exposed condition.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Protective coating should be applied to the surface.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.03.2021: Corrosion was found on top floor. 29-05-2022 (CCVV): Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get approved then their remediation will have no obstacles. 16-02-2023: Completed.

সংযুক্তি-সমূহ (১)

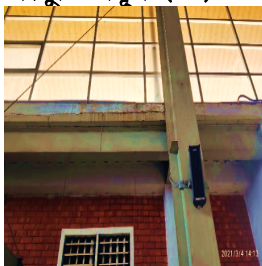

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified engineer to inspect damaged of structure and propose a suitable repair.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.03.2021: Corrosion was found on top floor. 29-05-2022 (CCVV): Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get approved then their remediation will have no obstacles. 16-02-2023: Completed.

সংযুক্তি-সমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 1 Approval drawing, full set of structural drawing, as built machine layout plan, floor load plan and soil test report were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.03.2021: Designs and drawings were submitted to RSC for review. Since then no response from RSC. Designs were not available on site. 29-05-2022 (CCVV): Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get approved then their remediation will have no obstacles. 16-02-2023: Completed.

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.03.2021: Designs and drawings were submitted to RSC for review. Since then no response from RSC. Designs were not available on site. 29-05-2022 (CCVV): Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get approved then their remediation will have no obstacles. 16-02-2023: Completed.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 2 High loading due to stored yarn roll and other goods. Height of goods 10'-0" and loading 150 psf.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.03.2021: Load was found to be below 150 psf and under the mark 10. 29-05-2022 (CCVV): Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get Reviewed then their remediation will have no obstacles. 16-02-2023: Completed.

সংযুক্তি-সমূহ (১)



৪.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.03.2021: Load was found to be below 150 psf and under the mark 10. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

সংযুক্তি-সমূহ (১)




৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 2 Approval drawing, full set of architectural drawing, soil test reports, as Build drawing of machine layout plan and floor load plan has not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	-
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.03.2021: Designs and drawings were submitted to RSC for review. Since then no response from RSC. Designs were not available on site. 22-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (৩)



৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building 3 Approval drawing, full set of structural drawing were not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	04.03.2021: Designs and drawings were submitted to RSC for review. Since then no response from RSC. Designs were not available on site. 29-05-2022 (CCVV): Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get Reviewed, then their remediation will have no obstacles. 16-02-2023: Their CAPs depends on designs and drawings that they submitted to RSC for review. If they get Reviewed, then their remediation will have no obstacles.

সংযুক্তিসমূহ (৩)

