



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	শ্রীতম ক্যাশন ওয়ার (প্রা.) লি.
ঠিকানা	168, (BJC) Godnail, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY206
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কার্ঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ৩১-০১-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Intensity of floor loading
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner is asked to shift all storage of ground floor immediately. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf (3KN/m ²) and loading intensity on the 1st floor must not exceed 2 KN/m ² .
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already dond this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20.09.2020: Found have storage on 1sf floor but intensity load not exceed 40 psf. CVV2:08-12-2020: Not found heavy storage in the floor area. Have found the storage at round floor. CVV3:31-03-2021: Not found heavy storage in the floor area. Have found the storage at round floor. 31/08/2021: Not found heavy storage in the floor area. Have found the storage at round floor. 31/08/2022: No Over load was found during inspection date. 31/01/2023: No Over load was found during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	As build design drawing
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Consultants strongly recommend to construct as build design drawing of the different structural elements of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have assign an engineer to do this job
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20.09.2020: Factory management said all design drawing submitted to DIFE but on inspection date they did not show any document. CVV2:08-12-2020: No as built design & drawing were available in site. They will submit revised design & drawing within December 31, 2020. CVV3:31-03-2021: No as built design & drawing were available in site. 31/08/2021: No as built design & drawing were available in site. 31/08/2022: No as built design & drawing was found during inspection date. 31/01/2023:No as built design & drawing was found during inspection date.


৩. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in primary structural elements
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	If any cracks appear we will engage a qualified structural engineer for necessary action.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20.09.2020: They did not take any action. CVV2:08-12-2020: No action has been taken yet. CVV3:31-03-2021: No action has been taken yet. 31/08/2021: They did not take any action. 31/08/2022: Distress in primary structural elements were found during inspection date. 31/01/2023: Distress in primary structural elements were found during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৩)

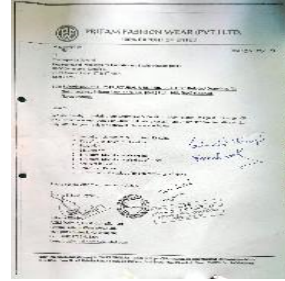

8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and vertical extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have no horizontal or vertical extension.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20.09.2020: Extension was found. Factory management said all design drawing submitted to DIFE but on inspection date they did not show any document. CVV2:08-12-2020: No horizontal and vertical extension details investigation documents have found in site. CVV2:31-03-2021: No horizontal and vertical extension details investigation documents have found in site. No initiative has been observed. On 31/08/2021: No horizontal and vertical extension details investigation documents have found in site. No initiative has been observed. 31/08/2022: Horizontal and vertical extension was found during inspection date. 31/01/2023: Horizontal and vertical extension was found during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৩)

