



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| কারখানার নাম | কোজিমা লিরিক গার্মেন্টস লি: |
| ঠিকানা | Plot-309, Chandon, Noljani, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP193 |
| কালার কোড | |


| | |
|--|--------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৪-০৮-২০২২ |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Load Plan |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory owner have been instructed to prepare & submitted a load plan of the factory building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৪-০৭-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | <p>Previous Timeline 27 Nov 2016, Given Timeline 24 July 2017: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. June 10, 2020: Factory has done contract with Auspicious BD Ltd. Load plan submitted and was reviewed on 99th Taskforce meeting. Told them to correct the plan and resubmit.</p> <p>01.10.2020: Load plan has been completed and posted on every floor wall.</p> <p>07.01.2021: Vetted Load plan was found posted on every floor. 08.06.2021: Vetted Load plan was found posted on every floor. 04.08.2022: Vetted Load Plan was found on each floor.</p> |

সংযুক্তিসমূহ (২)

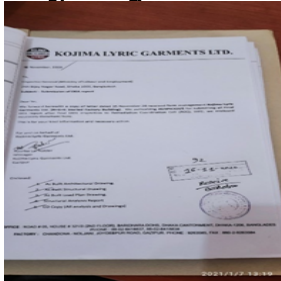

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Loading intensity |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Other than the basement, Loading intensity should be strictly maintained within 60 psf (2.87 kn/m2) . |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৪-০৭-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | Previous Timeline 27 Nov 2016, Given Timeline 24 July 2017 Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. June 10, 2020: Shed on the rooftop now being removed and working is under process. Not completely done at the moment. 01.10.2020: No over loading has been observed during CVV. 07.01.2021: No overloading was seen during inspection. 08.06.2021: No over loading has been found during CVV. 04.08.2022: No over loading has been found during visit day. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-----------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Extension |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | No horizontal & vertical extension shall be made without detail investigation. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Action taken & no extension was done by factory. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | June 10, 2020: No horizontal and vertical extension was found. 01.10.2020: No horizontal and vertical extension was found during inspection 07.01.2021: No vertical extension was found but a new shed was included on the factory premises and it was labelled as canteen, 1st floor of that structure is the mezzanine floor which is used as office space. 08.06.2021: No horizontal and vertical extension was found during inspection 04.08.2022: No horizontal and vertical extension was found during inspection. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



| | |
|---------------------------|----------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distress |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | owners/factory users should observe the development of any distress particularly in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৪-০৭-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | June 10, 2020: Dampness was found on rooftop stairs slab and also several places with water ponding on the rooftop. Some hairline crack was found on the masonry wall above 3rd floor fire door. 01.10.2020: distress has been not found during CVV 07.01.2021: Some hairline cracks were seen above fire doors. Dampness was seen on the rooftop near the lift core room. Exposed rebar was seen on the rooftop. Unhinged racks were seen on the underground storage unit and ground floor 08.06.2021:Some cracks are found above the fire door. 04.08.2022: Some non engineering hair cracks found on this building .Also dampness was found some position of the building. |

সংযুক্তিসমূহ (২)

