



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য


কারখানার নাম	গোমতী টেক্সটাইল লিঃ
ঠিকানা	Plot No-1163 (Opposite Ansar Academy) Shafipur, Kaliakoir, Gazipur,
কারখানার কোড	GZP142
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৩-০৮-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderated Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Coring with 4 nos. 4 in. cores (3 in. when taken from column) for the building and scanning of rebars in the Ground Floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Aug 12, 2020: Core test results have been found during inspection. 08.11.20220: DEA has been completed and related documents are found during visit. On 15th February 2021: All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing ,load plan found on site. They have already retrofitted the building and a CCVV was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate. 23.08.2022: They has been got approval from DIFE. Also CCVV visit done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate.

সংযুক্তিসমূহ (৪)

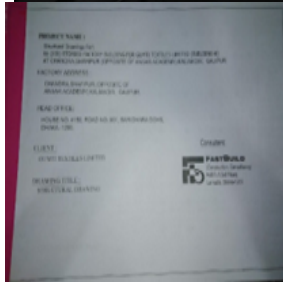



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Preparation of detail as built drawing
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of a qualified structural engineer prepare design documents accordance with as built condition supported by design report.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Aug 12, 2020: As built drawing has been found. 08.11.2020 As built drawing has been found and approved by DIFE. On 15th February 2021 :All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing ,load plan found on site. They have already retrofitted the building and a CCVV was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate. 23.08.2022: They has been got approval from DIFE. Also CCVV visit done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate.

সংযুক্তিসমূহ (২)

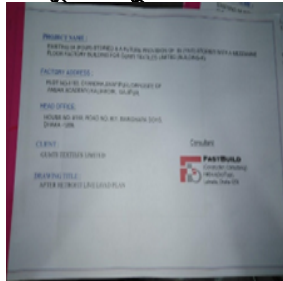


৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural Stability
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural analysis to ascertain safety of the structure and recommending remediation measure as per NTPA, if required
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Aug 12, 2020: Factory Engineer has reviewed design and retrofitting was done for structural stability. 08.11.2020 Factory Engineer has reviewed design and retrofitting was done for structural stability. On 15th February 2021 :All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing ,load plan found on site. They have already retrofitted the building and a CCVV was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate. 23.08.2022: They has been got approval from DIFE. Also CCVV visit done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate.

সংযুক্তিসমূহ (৩)



8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load Plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity as per NTPA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Aug 12, 2020: Load plan was found. 08.11.2020 Load plan has been found but not posted on wall. On 15th February 2021 :All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing ,load plan found on site. They have already retrofitted the building and a CCVV was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate. Load plan found hanged on wall in every floor. 23.08.2022: They has been got approval from DIFE. Also CCVV visit done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Soil investigation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to investigate the capacity of the soil
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Aug 12, 2020: Soil investigation report was found in the DEA. 08.11.2020: Soil investigation report was found in the DEA report On 15th February 2021 :All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing ,load plan found on site. They have already retrofitted the building and a CCVV was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate. Load plan found hanged on wall in every floor. Soil investigation report is attached with DEA. 23.08.2022: They has been got approval from DIFE. Also CCVV visit done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate.

সংযুক্তিসমূহ (১)

