



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| কারখানার নাম | অনন্ত স্পোর্টস ওয়ার লিঃ    |
| ঠিকানা       | Nishchintapur, Savar, Dhaka |
| কারখানার কোড | DHK045                      |
| কালার কোড    |                             |

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৭-০৮-২০২২

১. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      |  |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

১.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Building engineer to draw up plans for water proofing and drainage for the roof.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have taken action and completed this issue.   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | CVV Date- 27/12/2020: The factory has been completed its roof water proofing with proper rain water drainage system. On 07/06/2021: Remedial action has been taken regarding this issue. On 26.08.2021: Roof water proofing with proper rain water drainage system has completed 27/08/2022: Proper water proofing and drainage system was found during inspection date. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | No proper roof drainage and water proofing |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Install water proofing and drainage system.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have taken action and completed this issue.   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | CVV Date- 27/12/2020: The factory has been completed its roof water proofing with proper rain water drainage system. On 07/06/2021: Remedial action has been taken regarding this issue. On 26.08.2021: Roof water proofing with proper rain water drainage system has completed 27/08/2022: Proper water proofing and drainage system was found during inspection date. |

### সংযুক্তিসমূহ (২)



### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Exposed reinforcement |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                       |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Building Engineer need to check the exposed reinforcement and suggest a corrective action as required.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have taken action and completed this issue.  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | CVV Date- 27/12/2020: During the visit, There is no exposed reinforcement is found on the roof floor of the building. On 07/06/2021: Remedial action has been taken regarding this issue. On 26.08.2021: During the visit, There is no exposed reinforcement is found on the roof floor of the building. 27/08/2022: No Exposed reinforcements were found during inspection date. |

### সংযুক্তিসমূহ (২)



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Exposed reinforcement |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                       |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have taken action and completed this issue.  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | CVV Date- 27/12/2020: During the visit, There is no exposed reinforcement is found on the roof floor of the building. On 07/06/2021: Remedial action has been taken regarding this issue. On 26.08.2021: During the visit, There is no exposed reinforcement is found on the roof floor of the building. 27/08/2022: No Exposed reinforcements were found during inspection date. |

#### সংযুক্তিসমূহ (২)




|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Sheds do not appear on drawings |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                 |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Building to prepare as built drawings. Drawings to be submitted to authorities for approval.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will engage a building engineer to prepare as built drawings. Drawings will be submitted to authorities for approval.   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৮-০৮-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | CVV Date- 27/12/2020: As-built drawings have been prepared through DIFE non-listed consultancy firm. So the factory is advised to submit its drawings and analysis to DIFE through DIFE enlisted consultancy firm. On 07/06/2021: The drawing of Sheds is appear on as built architectural drawing and its specification found on structural drawing. On 26.08.2021: The drawing of Sheds is appear on as built architectural drawing and its specification found on structural drawing. 27/08/2022: Sheds were appear on as built architectural drawing and its specification found on structural drawing during inspection date. |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)

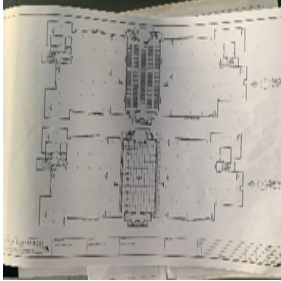



#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Non engineered connection and bracing system |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৬.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the bracing system is required to ensure the stability of the structure.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will engage a building engineer to observe the connection of steel structure to check the bracing system to ensure the stability of the structure.  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৮-০৮-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | CVV Date- 27/12/2020: The connection of steel structure have been checked through DIFE non-listed consultancy firm. So the factory is advised to submit its drawings and analysis to DIFE through DIFE enlisted consultancy firm. On 07/06/2021:The connection of steel structure have been checked through consultancy firm.Non engineering connection and bracing system has not been found on roof.Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already excute the remediation process of roof truss. On 26.08.2021: The connection of steel structure have been checked through consultancy firm.Non engineering connection and bracing system has not been found on roof.Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already excute the remediation process of roof truss. 27/08/2022: The DEA report has received approval from RSC. As Built drawing and retrofit drawing were found on site during inspection date. |

#### সংযুক্তিসমূহ (২)



#### ৭. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Non engineered connection and bracing system |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will engage a building engineer to observe the connection of steel structure to check the bracing system to ensure the stability of the structure and carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.   |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৮-১০-২০১৭  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | <p>CVV Date- 27/12/2020: The remedial action has been completed by Building Engineer but the consultancy firm is DIFE non-listed. So the factory is advised to submit its drawings and analysis to DIFE through DIFE enlisted consultancy firm.</p> <p>On 07/06/2021: The connection of steel structure have been checked through consultancy firm. Non engineering connection and bracing system has not been found on roof. Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already excite the remediation process of roof truss. On 26.08.2021: The connection of steel structure have been checked through consultancy firm. Non engineering connection and bracing system has not been found on roof. Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already excite the remediation process of roof truss. On 26.08.2021: The connection of steel structure have been checked through consultancy firm. Non engineering connection and bracing system has not been found on roof. Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already excite the remediation process of roof truss.</p> <p>27/08/2022: The DEA report has received approval from RSC. As Built drawing and retrofit drawing were found on site during inspection date.</p> |

#### সংযুক্তিসমূহ (২)

