গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বেঙ্গল নিটেক্স লিঃ
ঠিকানা	59/1 Atis Dipankar Road,
কারখানার কোড	DHK099
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৪-০২-২০২৩

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Details Engineering Assesment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A details engineering assesment is needed to find actual condition of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	17/08/2020: Factory management already contract to DIFE's enlisted firm for DEA and consultant completed DEA and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. CVV-2 Dated 03.11.2020: Task Force Meeting happened on July-23-2019,and task force suggested them some correction. but still now they did not submit any corrective document to the RCC Head-Quarter. 03.02.2021: Task Force Meeting happened on July-23-2019,and task force suggested them some correction. but still now they did not submit any corrective document to the RCC Head-Quarter. On 08.04.2021: Task Force Meeting happened on July-23-2019,and task force suggested them some correction. but still now they did not submit any corrective document to the RCC Head-Quarter. On 12.08.2021: Factory management already contract to DIFE's enlisted firm for DEA and consultant completed DEA and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. But Review drawing has not submitted yet. 07/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE as soon as possible. 14/02/2023: Revised DEA report must be resubmitted to DIFE as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (৪)

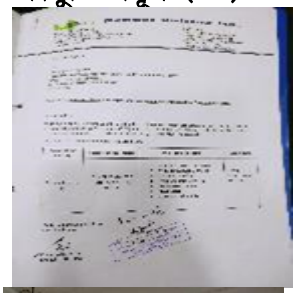

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and ongoing, they have agreed to complete within timeline by an consultancy firm
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	17/08/2020: Floor load plan is prepared by consultant and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. CVV-2 Dated 03.11.2020: Task Force Meeting happened on July-23-2019,and task force suggested them some correction. but still now they did not submit any corrective document to the RCC Head-Quarter. On 03.02.2021: Floor load plan is prepared by consultant and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. On 08/04/2021:Floor load plan is prepared by consultant and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. On 12.08.2021: Floor load plan is prepared by consultant and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. Review drawing has not submitted yet. 07/08/2022: Load plan prepared and must be submitted to DIFE as soon as possible. 14/02/2023: Load plan prepared and must be submitted to DIFE as soon as possible.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No Horizontal and Vertical Extension have been taken place until today since the day of assessment
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17/08/2019: No vertical or horizontal extension was found during the inspection day. CVV-2 Dated 03.11.2020: Same as previous visit. On 03.02.2021: No vertical or horizontal extension was found during the inspection day. On 08/04/2021: Completed as previous inspection. On 12.08.2021: No vertical or horizontal extension was found during the inspection day. 07/08/2022: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date. 14/02/2023: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (২)

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampnes and Cracks
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Moderate to major damp/efflorescence on plaster of the exterior wall of the basement floor of the building was observed. At several locations in stairs net cement finished surfaces (non- structural part) were found to be cracked and partially damaged. Cracked and partially damaged net cement finished topping in floors and stair cases of the building shall be repaired by adopting appropriate method for both aesthetic and serviceability requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and completed
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17/08/2020: Dampness was found in different areas. Also finds a hairline crack in structural element. DEA report was not availed in factory. Consultant works on this issues. CVV-2 Dated 03.11.2020: No dampness occurred during the field visit. 03.02.2021: Factory management solved this issue. No dampness found on inspection day. On 08/04/2021: Completed as previous inspection. On 12.08.2021: Factory management solved this issue. No dampness found on inspection day. newly painted this building. 07/08/2022: No Dampness and cracks were found during the inspection date. 14/02/2023: No Dampness and cracks were found during the inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (২)
